

Relatório de Obras 2º Trimestre 2016

Contatos
Fundos Imobiliários
 Tel. (11) 3509-6600
 middleoffice.fii@riobravo.com.br

Ouvidoria
 Tel. 0800 722 9910
 ouvidoria@riobravo.com.br

Comentários do Gestor

No 2º Trimestre de 2016 o Fundo não realizou pagamentos para Obra de FL Macaé.

Dados do Empreendimento

Descrição: Laboratório de Fluidos - Monitorar a qualidade do Petróleo e gás natural do Sul e Sudeste e pesquisas/descobertas do Pré-Sal - Projeto FL Macaé.

Participação do Fundo: 100%


Dados

Localização da Obra: Imboassica - Macaé-RJ
Construtora: Multitek Engenharia Ltda
Gestor da Obra: Petróleo Brasileiro - S.A - Petrobrás
Data do início da Obra: Janeiro 2012
Entrega Prevista: 2016

Cronograma Andamento da obra

Valor total a ser investido: R\$ 125.271.518,73
Investimento no Trimestre: R\$ 0,00
Investimento Acumulado: R\$ 109.382.530,91
Evolução Acumulada: 87,32%

Evolução Física da Obra

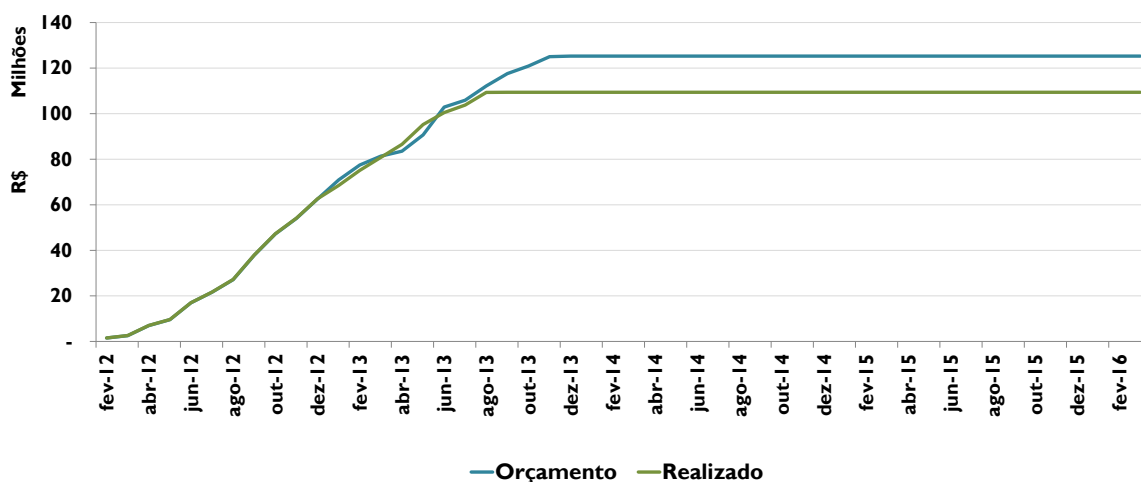

— Orçamento — Realizado

Registro Fotográfico



Disclaimer

Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresso e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas.
